

PÔLE ENFANCE CULTURE & LOISIRS

Orliénas
Commune du Rhône



UN PROJET AMBITIEUX, DURABLE ET ÉVOLUTIF

qui va répondre
aux besoins immédiats
et pour les 10 ans à venir.

UN PROJET RÉFLÉCHI

pour que les équipements
puissent se développer
dans ce même périmètre,
lors d'une seconde phase,
et couvrir les besoins
pour les 30 prochaines années.

CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE

avec le soutien de



CONSTRUCTION D'UNE CRECHE INTERCOMMUNALE

Maîtrise d'ouvrage



RENOVATION EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE

avec le soutien de



EXTENSION LOCAUX TECHNIQUES

PÔLE ENFANCE CULTURE & LOISIRS

RENOVATION EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE

avec le soutien de



CONSTRUCTION D'UN PARC PUBLIC ET D'UNE COUR D'ECOLE

avec le soutien de



CONSTRUCTION D'UN RESEAU DE CHALEUR BOIS

Maîtrise d'ouvrage



Rappel du projet

Le périmètre des Ecoles, derrière la Mairie, va s'étoffer de quelques nouvelles constructions et d'aménagements extérieurs : un nouveau bâtiment pour accueillir la crèche et l'école maternelle, l'agrandissement du restaurant scolaire et de la bibliothèque, l'extension des locaux des services techniques, l'aménagement des cours, la création d'un jardin pour la crèche et d'un parc public.

L'architecte retenu a répondu à la volonté de la Commune en proposant un projet sobre, qui s'adapte au terrain pour une parfaite intégration dans l'environnement, avec des bâtiments fonctionnels qui respectent les exigences environnementales dans leur construction comme dans leur utilisation, le tout dans un budget maîtrisé.

Ce projet doit répondre au déficit d'équipements actuels pour faire face à l'augmentation de la population des prochaines années.

Il s'agit d'un projet ambitieux, durable et évolutif car il va répondre aux besoins immédiats et pour les 10 ans à venir. Il a été réfléchi pour que les équipements puissent se développer dans ce même périmètre, lors d'une seconde phase, et couvrir les besoins pour les 30 prochaines années.





Suivi des travaux



Novembre 2024

Restaurant scolaire
et médiathèque :
Prêt pour l'ouverture !



▲ Vue depuis la cour d'école



▲ Extension
de la médiathèque



▲ Salle à manger
des maternelles



Côté bâtiment
école et crèche :
poursuite
du gros œuvre

◀ Pose du bardage
côté nord

Fondation du préau ▶



Prochaines étapes

Janvier 2025 :

Bâtiment maternelle et crèche :

Démarrage des travaux de second œuvre

Bâtiment services techniques :

Fin des fondations et élévation des murs.

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en
Mairie le deuxième
samedi de chaque mois,
de 11h à 12h.

Septembre 2024

Dernière ligne droite avant livraison du restaurant scolaire et de la bibliothèque !



Pose des faux-plafonds



Pose des carrelages



Pose des équipements de cuisine

Côté bâtiment école et crèche

Pose des menuiseries et élévation des murs sur l'école



Prochaines étapes

Novembre 2024 :

Bâtiment maternelle et crèche :

Mise en place de la couverture

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Enfin l'ouverture !

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en Mairie le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à 12h.

Juillet-août 2024

Pas de vacances pour les travaux !

L' école maternelle prend forme



Passage du réseau de chaleur à travers la cour des écoles

Coulage des chapes et résines dans le restaurant scolaire



Prochaines étapes

Septembre/octobre 2024 :

Bâtiment maternelle et crèche :

Fin des élévations du bâtiment "partie est"

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Montage de la cuisine, pose des revêtements et finitions

Bâtiment services techniques :

Élévation des murs

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous
en Mairie
le 14 septembre
de 11h à 12h.

À LA
RENCONTRE
DES POLES
Enfance Culture Loisirs

Juin 2024


Zoom sur le bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire



Agrandissement
de la bibliothèque



Démolition des cloisons
dans le restaurant scolaire

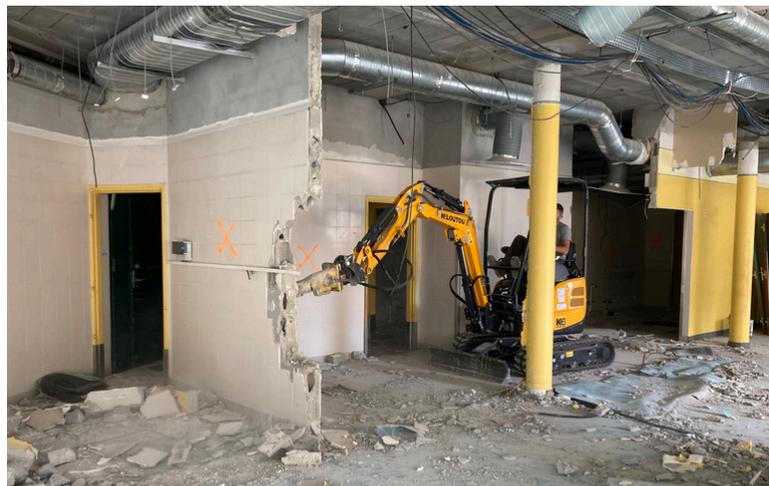

Prochaines étapes

Juillet/août 2024 :

Bâtiment maternelle et crèche :

Élévation des murs à ossature bois

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Travaux d'aménagement intérieur

Bâtiment services techniques :

Fondation et élévation des murs de la chaufferie bois

Cour des écoles :

Réalisation des tranchées pour passage du réseau de chaleur

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous
en Mairie

le 14 septembre
de 11h à 12h.

À LA
RENCONTRE
DES POLES
Enfance Culture Loisirs

Avril 2024

L'école
a son plancher.



L'extension
du restaurant scolaire
prend forme.

Prochaines étapes

Mai 2024 :

Bâtiment maternelle et crèche :

Coulage des fondations du préau
et élévation des murs du rez-de-chaussée de l'école

Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :

Élévation des murs bois et pose de la charpente

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en
Mairie le deuxième
samedi de chaque mois,
de 11h à 12h.


À LA
RENCONTRE
DES POLES
Enfance Culture Loisirs

Avril 2024

La crèche prend forme !

Côté bâtiment école et crèche

Après la pose du plancher chauffant, place à l'élévation des murs de la crèche.

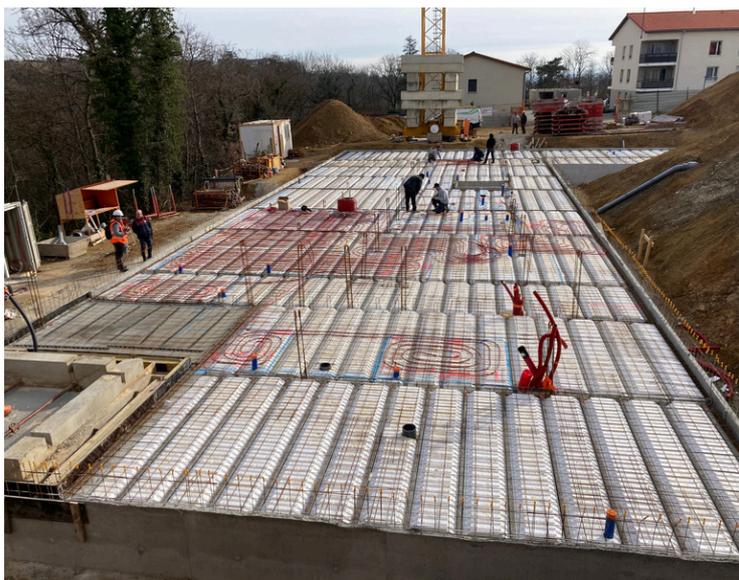

Prochaines étapes

Avril 2024 :
Coulage du plancher de l'école puis remblaiement des terres autour du bâtiment.

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en Mairie le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à 12h.

À LA RENCONTRE
DES POLES
Enfance Culture Loisirs

Mars 2024

ça avance !

Côté bâtiment
bibliothèque
et restaurant scolaire

La bibliothèque s'enveloppe d'isolant en laine de bois
et la cuisine du restaurant s'agrandit.

Le restaurant dispose désormais d'une zone de livraison et de vestiaires
à l'étage inférieur, les élévations de la future salle de restaurant
des maternelles va pouvoir débuter.

Pendant les vacances d'hiver, les massifs du futur préau
donnant sur la cour élémentaire ont été coulés.



Prochaines étapes

Avril 2024 :

Élévation des murs bétons sur l'extension de la zone cuisine
et montage de la structure bois sur la salle de restaurant.

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en
Mairie le deuxième
samedi de chaque mois,
de 11h à 12h.



Janvier 2024

Ce sont les fondations

Ce mois de janvier a été consacré au coulage des fondations du bâtiment crèche/école maternelle et à l'élévation du soubassement du vide-sanitaire.



Prochaines étapes

Février 2024 :

- **Bâtiment maternelle et crèche :**

Coulage de la dalle niveau crèche/élévation des murs.

- **Bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire :**

Montage de la grue/coulage des fondations/élévation du sous-sol/réalisation des fondations du futur préau devant le restaurant scolaire.

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en Mairie le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à 12h.

Décembre 2023

La grue est en place !

20 décembre 2023 :
mise en place de la grue et...
installation des lucarnes afin que
les élèves puissent suivre les travaux en
toute sécurité depuis la cour de l'école !



*Lucarne spécial "suivi de chantier"
pour les élèves de l'école.*

Prochaines étapes

Janvier 2024 :

- Montage grue pour extension du bâtiment bibliothèque et restaurant scolaire
- Début des fondations des deux bâtiments

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en Mairie le deuxième samedi de chaque mois, de 11h à 12h.

Octobre 2023

c'est parti !

23 octobre 2023 : démarrage des travaux

Vacances de Toussaint :

Démontage des préaux dans les cours
maternelle et élémentaire

Mise en place du barriérage de chantier

Début des terrassements

pour l'implantation du bâtiment

école maternelle et crèche.

1ère surprise ! Purge des fondations

du préau de la maternelle

=> 4 "menhirs" de 7 tonnes chacun !



Préparation du terrain



Démontage des préaux



Début du terrassement

Prochaines étapes

Préparation plate-forme nouveau bâtiment école maternelle
et crèche/Terrassement bâtiment bibliothèque et
restaurant scolaire

Fin décembre 2023 : installation de la grue

Janvier et février 2024 : fondations bâtiment école maternelle
et crèche

Février 2024: fondations bâtiment bibliothèque et restaurant
scolaire

DES QUESTIONS ?

Retrouvons-nous en
Mairie le deuxième
samedi de chaque mois,
de 11h à 12h.
